JSS DÉBOUCHAGE D'URGENCE



0493 790 384



FAIRE APPEL À NOUS, C'EST FAIRE LE CHOIX DE VOTRE TRANQUILLITÉ

JSS Débouchage
Rue Bois de Gomzé 8, 4140 SPRIMONT
TVA BE0770825742
BNP PARIBAS FORTIS BE07 0019 1072 2366

VOTRE PROFESSIONNEL DE L'EGOUTTAGE

JSS & Vidanges Herman

Débouchage de canalisations

- Débouchage : WC/Douche/Baignoire/Evier
- Chemisage des canalisations
- Curage de canalisations
- Décalcarisation
- Détection de fuites par sonar
- Passage caméra avec rapport
- Pompage des eaux
- Nettoyage haute pression
- Remplacement de canalisation
- Vidange fosses septiques
- Vidange citerne eau de pluie
- Location de containers
- Tous travaux de plomberie
- Petits travaux de terrassement



TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CANALISATION



UN SERVICE FIABLE, RAPIDE ET PROFESSIONNEL



CHEMISAGE DES CANALISATIONS RÉHABILITATION SANS TRANCHÉE



VIDANGE ET POMPAGE DES EAUX

0493 790 384

info@jssdebouchage.be - www.jss-debouchage-canalisations-liege.be/

JSS Débouchage de canalisations Srl
Rue Bois de Gomzé 8 · 4140 Sprimont
GSM 0493 790 384 · info@jssdebouchage.com
TVA BE 0770 825 742

JSS DÉBOUCHAGE

ENDOSCOPIE PAR CAMÉRA



PORTE D'ENTRÉE

Inspection caméra réalisée par : ANTOINE

MÉTHODES UTILISÉES

- [x] Contrôle visuel
- [x] Curage avant endoscopie
- [x] Endoscopie par caméra
- [ ] Dans le sens contraire de l'évacuation
- [x] Aspiration par camion hydrocureur
- [ ] Colorant de traçage
- [ ] Détection par impulsion électrique (Sonar)

DESCRIPTION DU CONTRÔLE

POINT DE DÉPART
REGARD DANS LA CANALISATION PRINCIPALE

POINT D'ARRIVÉE
VERS LA MISE A L'EGOUT

PHOTO DU POINT DE DÉPART


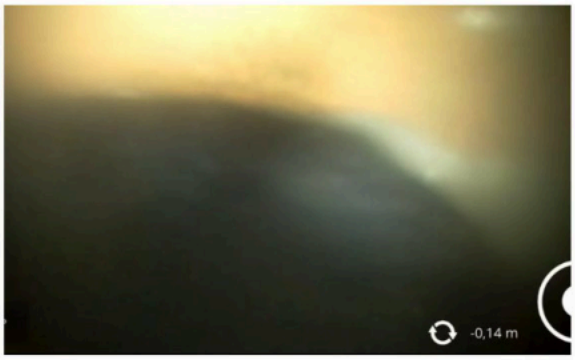


PHOTO DU POINT D'ARRIVÉE

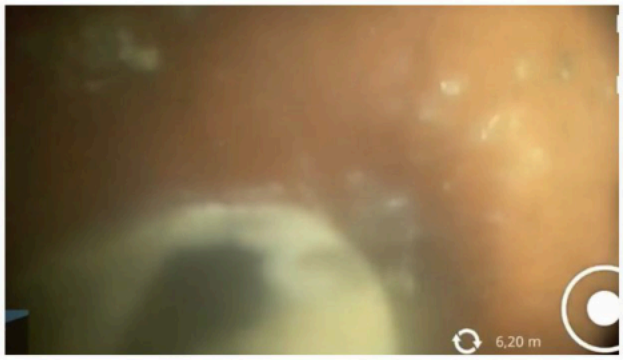

Situation avant notre arrivée

BOUCHONS A REPETITIONS
DEBORDEMENTS EN CAVE

Diagnostic

CANALISATION EN GRES DN150
SIPHON BETONNE
INSPECTION CAMERA AVANT LE CURAGE IMPOSSIBLE CAR TROP OBSTRUEE DE GRAISSE
CANALISATION DÉSAXÉE - NON ÉTANCHE
REDUCTION DE LA CANALISATION
CANALISATION ABIMEE
DÉBOÎTEMENT - NON ÉTANCHE
IMPOSSIBLE D'ALLER PLUS LOIN
SIPHON DISCONNECTEUR

Solution

Il faudrait prévoir de couper les eaux afin de pouvoir effectuer une inspection caméra du siphon vers la mise à l'égout, car les bouchons à répétition se situent toujours après le siphon, en direction de la mise à l'égout.


Le réseau côté établissement ne présente aucune anomalie et dispose d'un dégraisseur. Le problème ne provient donc pas de ce côté.

Nous proposons donc d'être sur les lieux à 6h du matin avec le camion afin de pomper les eaux présentes dans la canalisation, suivi d'une inspection caméra.


LIMITES D'INVESTIGATION

L'accès complet à la conduite jusqu'à sa mise à l'égout étant impossible, l'inspection n'a pu être menée jusqu'à son extrémité. Aucune conclusion ne peut être apportée concernant la partie située en aval du dernier point inspecté. Les responsabilités de JSS Débouchage se limitent exclusivement aux sections visibles et accessibles au moment de l'intervention.

SIPHON EN GRES DN150

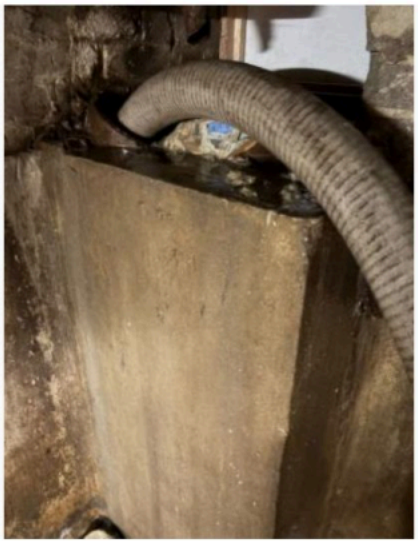


LA CAVE A ÉTÉ TOTALEMENT ASPIRÉE, NETTOYÉE ET DÉSINFECTÉE

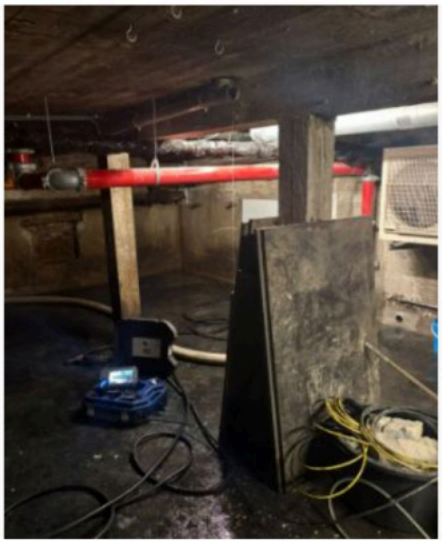


CANALISATION DESAXEE + REDUCTION DU SIPHON VERS LA MISE A L'EGOUT - VIELLE CANALISATION EN GRES ABIMEE - EMPECHE LE BON ECOULEMENT DES EAUX




DÉBUT DE L'ENDOSCOPIE AU DÉPART DE REGARD DANS LA CANALISATION PRINCIPALE
CANALISATION DÉSAXÉE - NON ÉTANCHE
REDUCTION DE LA CANALISATION

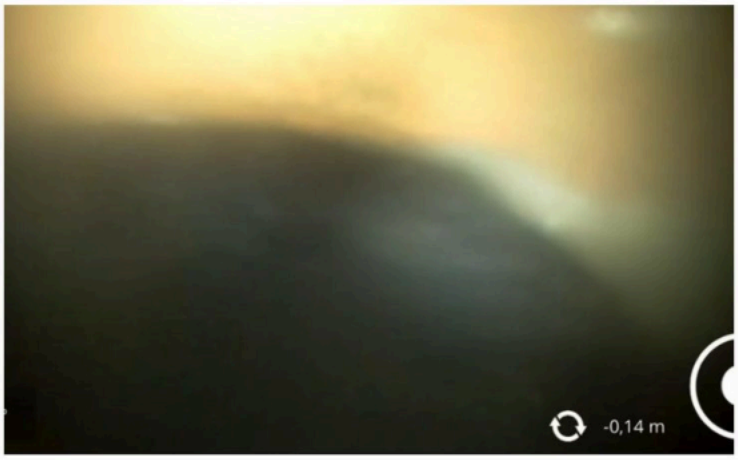


CANALISATION ABIMEE

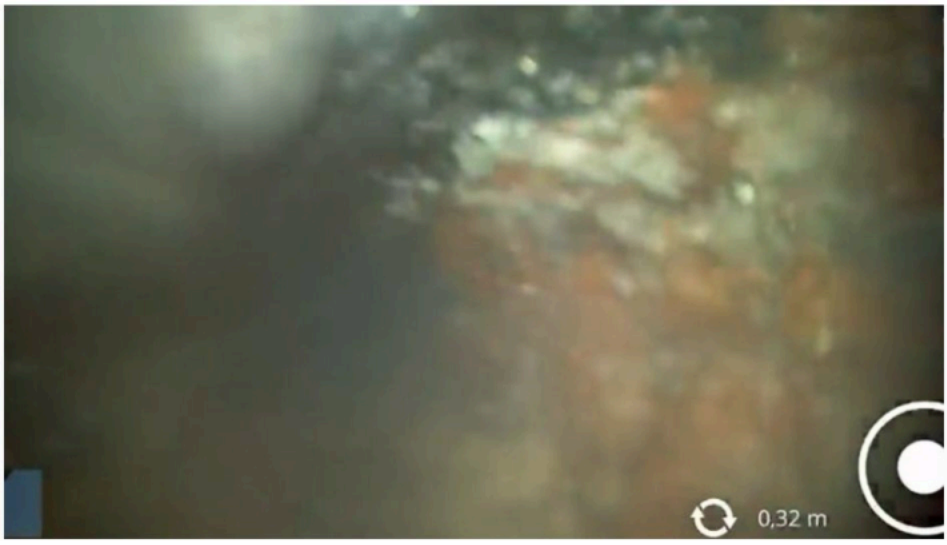


DÉBOÎTEMENT - NON ÉTANCHE

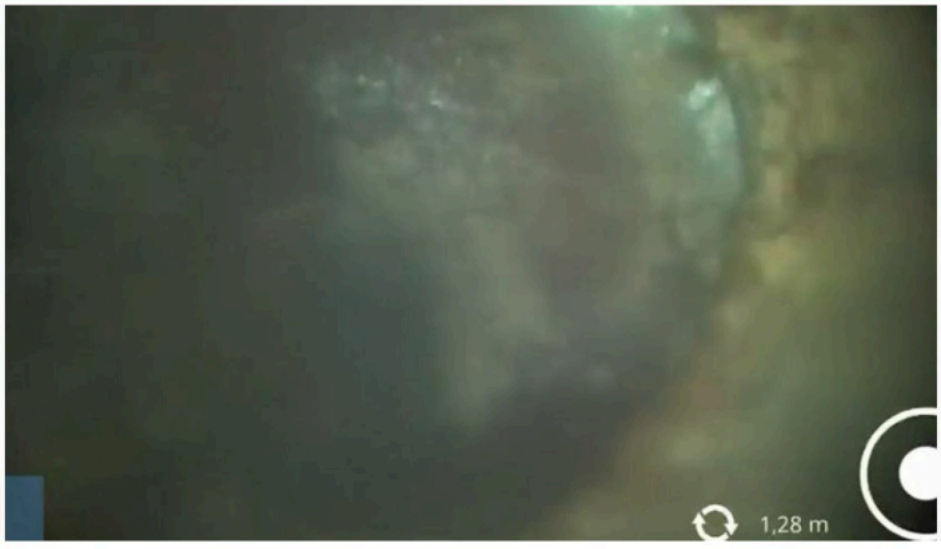


DÉBOÎTEMENT - NON ÉTANCHE

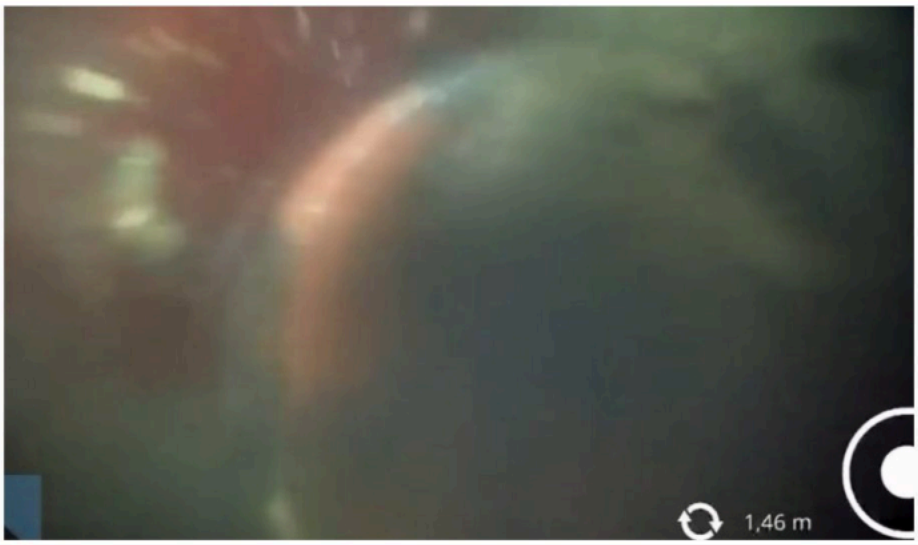


DÉBOÎTEMENT - NON ÉTANCHE

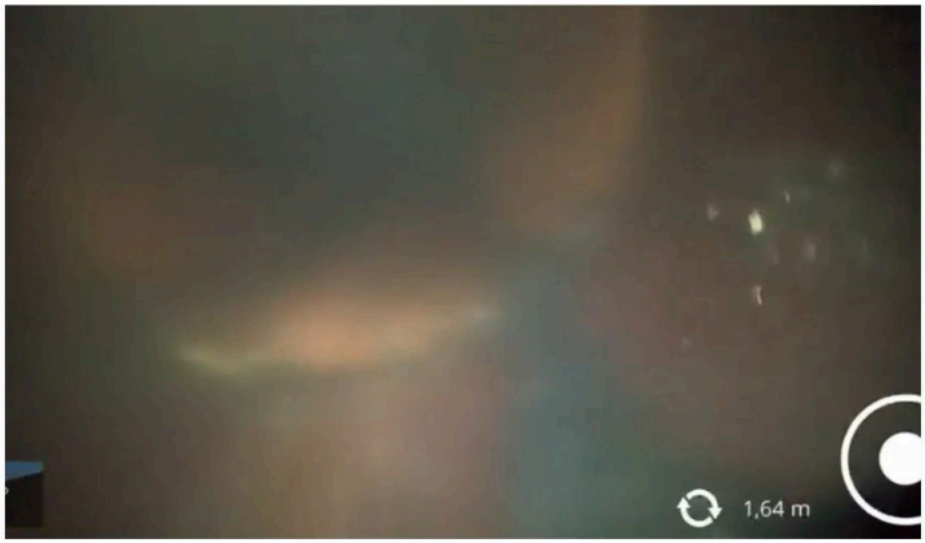


DÉBOÎTEMENT - NON ÉTANCHE

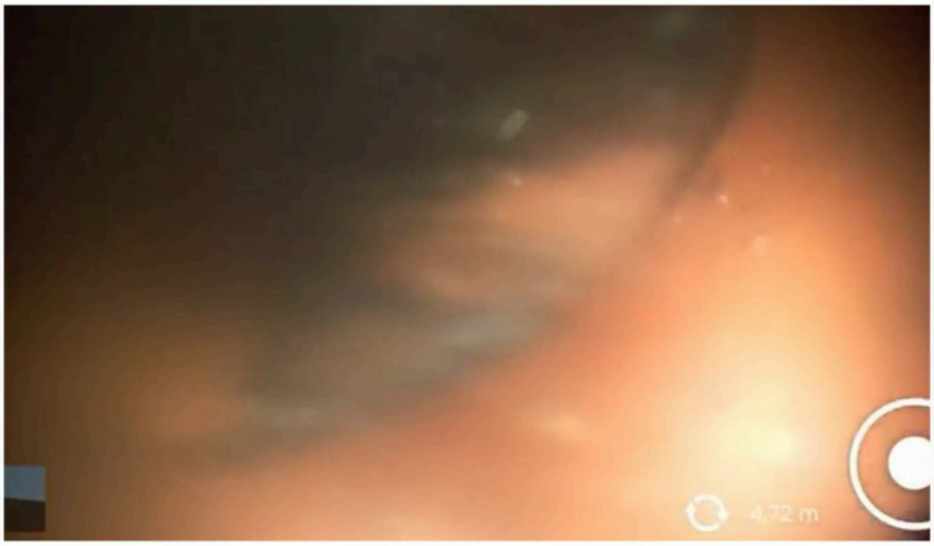

DÉBOÎTEMENT - NON ÉTANCHE

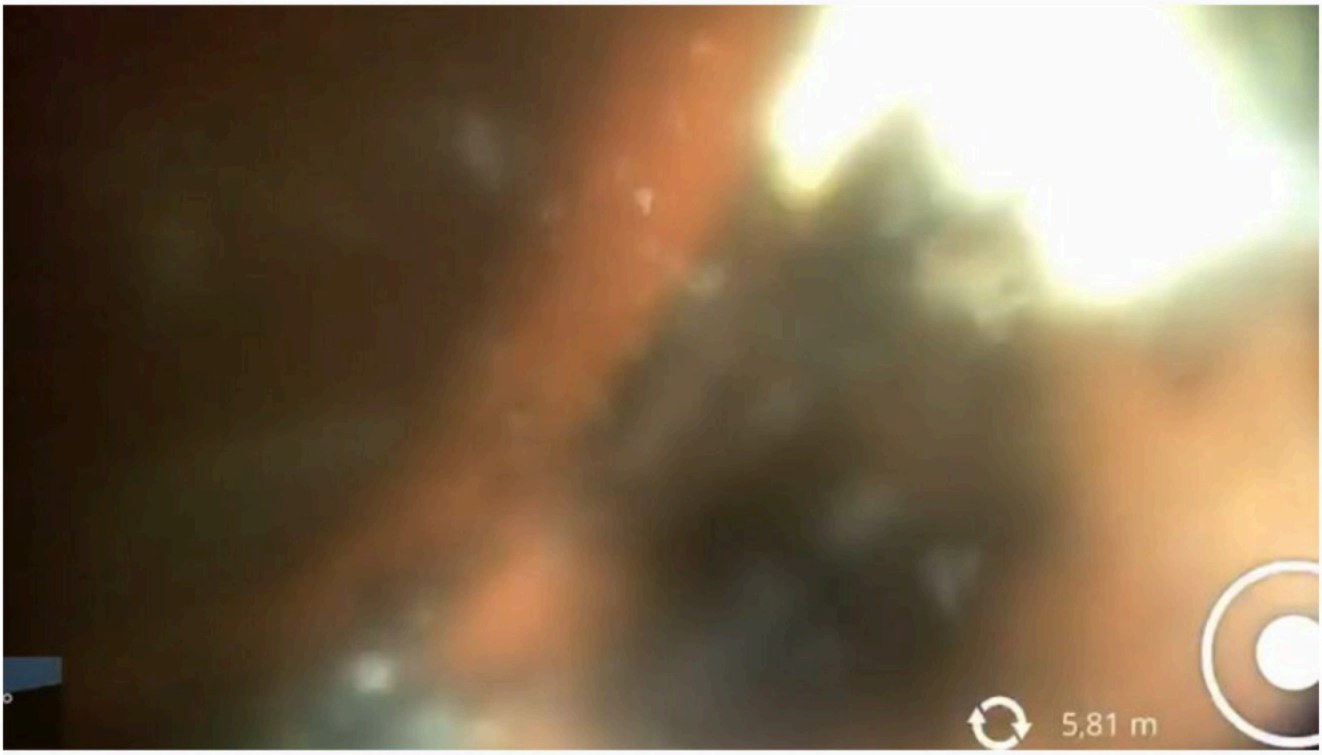

IMPOSSIBLE D'ALLER PLUS LOIN
SIPHON DISCONNECTEUR

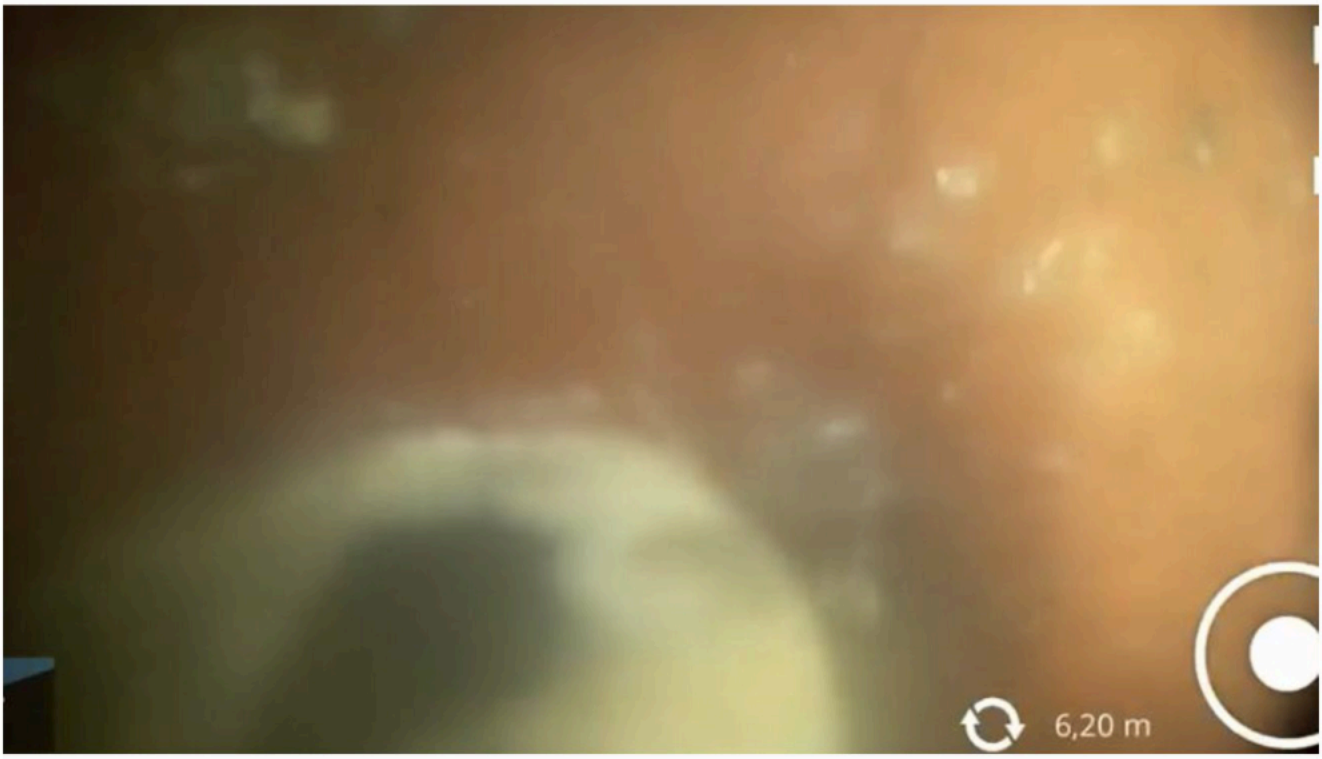

JSS

DÉBOUCHAGE

FIN DU RAPPORT

JSS Débouchage de canalisations Srl
